Office 365

PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET

• IMPLÉMENTATION D'OFFICE 365 •

Time'EATS

Table des matières

1. Introduction et méthodologie utilisée 4
   1.1. Contexte de l'entreprise 4
   1.2. Positionnement du projet Microsoft 365 4
   1.3. Objectifs du PMP 5
   1.4. La méthodologie utilisée 5
2. Pourquoi ce projet ? 6
   2.1. Origine du projet 6
   2.2. Enjeux et apports attendus 6
   2.3. Caractère prioritaire du projet 7
   2.4. Étude d'opportunité, faisabilité, ROI 7
      2.4.1. Opportunité 7
      2.4.2. Faisabilité 8
      2.4.3. Le ROI 9
3. Objectifs et périmètre du projet 10
   3.1. Objectifs 10
   3.2. Définition du périmètre 11
   3.3. Livrables attendus 12
   3.4. Critères de succès 13
4. Priorisation de ce projet 14
5. Organisation du projet 14
   5.1. Parties prenantes du projet 14
   5.2. Matrice RACI 15
   5.3. Organigramme projet 16
6. Planning prévisionnel 16
   6.1. Les grandes phases 16
   6.2. Durée et les jalons clés 18
   6.3. Diagramme de GANT et PERT 18
7. Gestion des coûts 20
   7.1. Budget prévisionnel 20

7.2. WBS 21
7.3. Estimation des coûts humains 21
7.4. Budget Global 23
8. Communication 24
8.1. Plan de communication 24
8.2. Réunions 24
8.3. Support de formation 25
9. Les KPI 25
10. Gestion des risques 26
11. Plan de tests et recette 27
11.1. Les tests techniques 27
11.2. Critères de validation 28
11.3. PV de recette 28
12. Clôture du projet 29
12.1. Bilan du projet 29
12.2. Capitalisation et REX 29
12.3. Archivage 29
Annexe 31
WBS 31
Plan de communication 32
Gestion des risques 34
Procès-Verbal 35
Formulaire de satisfaction 36

1. Introduction et méthodologie utilisée

1.1. Contexte de l'entreprise

Time'Eats est une entreprise spécialisée dans la vente de plats préparés et l'organisation de prestations à domicile avec des traiteurs ou chefs à domicile. Elle dispose d'un siège à Rennes, de 2 entités de production et conditionnement à Morlaix et Concarneau et de différents bureaux de représentation dans les principales villes de Bretagne. Elle affiche une volonté de croissance et prévoit une expansion nationale dans les années à venir. Cette ambition s'accompagne de la mise en place de plusieurs projets numériques, portés par la direction du système d'information.

Dans ce contexte, Time'Eats a défini une feuille de route à court et moyen terme. Son objectif prioritaire pour l'année à venir est de proposer, via une application web et mobile, un service complet permettant aux clients de commander en ligne une prestation auprès des traiteurs ou chefs à domicile.

Sous deux ans, l'entreprise vise les objectifs suivants :

- 1 million de clients finaux supplémentaires
- 10 000 partenaires (chefs, traiteurs ou établissements de restauration référencés sur la plateforme)

À moyen et long terme, Time'Eats ambitionne de devenir un acteur majeur du marché français, avec une part de marché à plus de 25 % sous 5 ans. Pour cela, elle fait le choix de se différencier sur l'aspect qualitatif et durable, en évitant la confrontation directe avec les géants internationaux du secteur. Elle mise sur :

- Une implantation nationale forte
- Une politique de neutralité carbone
- Une sélection de produits et partenaires qualitatifs

Ce positionnement stratégique implique une montée en compétence numérique forte, appuyée sur un système d'information solide et cohérent.

1.2. Positionnement du projet Microsoft 365

Le projet Microsoft 365 fait partie des premières actions à réaliser dans le cadre de la transformation numérique de Time'Eats. Il a pour objectif principal d'équiper les équipes d'outils modernes et partagés pour faciliter le travail collaboratif.

Il est positionné avant d'autres projets majeurs, comme le CRM et les applications mobiles, car il constitue une base technique et fonctionnelle nécessaire à leur bon déroulement. Il s'inscrit donc comme une étape importante dans la modernisation du système d'information de l'entreprise.

1.3. Objectifs du PMP

Le Plan de Management de Projet (PMP) est le document de référence qui formalise comment le projet sera conduit, piloté et contrôlé. Il répond à la question :

Quelle approche permettra d'atteindre les objectifs du projet ?

- Aligner l'équipe projet, les parties prenantes autour d'une vision commune
- Anticiper les méthodes de gestion à appliquer (par exemple sur la gestion des risques)
- Centraliser les décisions et les responsabilités de chacun
- Faire office de feuille de route tout au long du projet

Le PMP a pour vocation à évoluer durant toute la vie du projet. Il peut être ajusté selon les besoins, les décisions prises par le comité de pilotage, ainsi que l'apparition de nouveaux risques ou de nouvelles contraintes. Sa mise à jour permet de maintenir un cadre clair et partagé, même en cas d'imprévus.

1.4. La méthodologie utilisée

Le projet sera mené selon une méthodologie de cycle en V. Il s'agit d'un modèle de gestion de projet dans lequel chaque phase est réalisée l'une après l'autre. Chaque étape doit être validée avant de passer à la suivante.

Ce modèle est particulièrement adapté aux projets dont chaque phase dépend de la précédente. Pour construire une maison, il faut d'abord poser les fondations, puis monter les murs, avant d'envisager la pose du toit. Chaque étape repose sur la solidité de celle qui la précède.

Cette approche s'avère pertinente, car :

- Les objectifs sont clairement définis dès le départ, il doit permettre de disposer d'outils de collaboration et de bureautique
- Les besoins ne sont pas amenés à évoluer en cours de projet car il doit garantir une meilleure accessibilité et disponibilité des données de l'entreprise
- La solution retenue repose sur des composants standardisés, déployable par les collaborateurs de la DSI

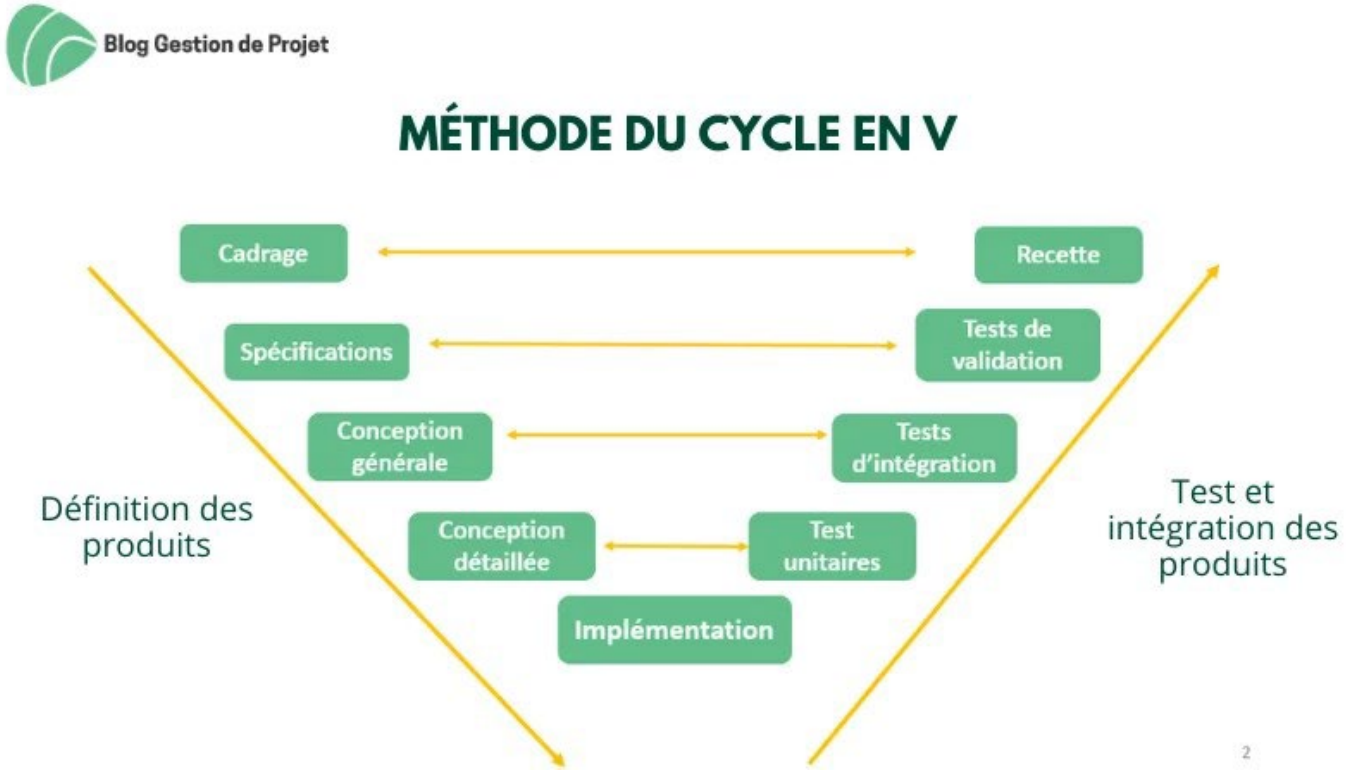

Source : https://blog-gestion-de-projet.com/cycle-en-v/

2. Pourquoi ce projet ?

2.1. Origine du projet

L'entreprise prépare une phase d'expansion nationale et le déploiement de plusieurs outils. Le système d'information doit donc évoluer vers un environnement plus structuré, sécurisé.

Le projet répond à un besoin identifié, qui permet de doter les équipes d'une suite bureautique, accessible depuis différents sites.

2.2. Enjeux et apports attendus

Ce projet vise à :

- Standardiser les outils bureautiques et collaboratifs
- Renforcer l'accès sécurisé et partagé aux ressources de l'entreprise
- Améliorer la productivité interne et la fluidité des échanges

- Préparer le terrain pour l'intégration des futures solutions métier

2.3. Caractère prioritaire du projet

Son déploiement est planifié avant celui du CRM et des applications mobiles.

Avec un budget maîtrisé (100 000 €), une durée courte (2 mois), et une charge de 220 jours/homme, il est alors faisable. Le niveau de risque est estimé à un niveau modéré (3/5), notamment grâce au recours à une solution standard.

Un dispositif de pilotage permettra d'en suivre les jalons, avec des indicateurs SMART définis dans les parties suivantes.

2.4. Étude d'opportunité, faisabilité, ROI

2.4.1. Opportunité

Aujourd'hui, les équipes de Time'Eats ne présente pas ou présente peu d'outils numérique. Cela occasionne des pertes de temps, des doublons, des difficultés à travailler à distance ou entre sites (Rennes, Morlaix, Concarneau). Le besoin est donc de mettre en place une solution unique, accessible et collaborative, qui serve de base aux futurs outils numériques.

Le projet permettra d'harmoniser les outils et de simplifier les échanges internes. Les équipes pourront mieux partager leurs documents, organiser leurs réunions à distance, et collaborer en temps réel. Cela permettra de gagner du temps et d'améliorer la productivité avec un environnement de travail plus fluide. Cela pose aussi les bases pour intégrer, plus tard, un CRM et des applications mobiles.

Deux options ont été étudiées :

- Déployer la solution partiellement (par exemple seulement Teams)

- Faire un déploiement complet de Microsoft 365, avec accompagnement et des formations (solution retenue)

C'est cette dernière option qui est considérée comme la plus cohérente, tant sur le plan technique que stratégique.

Le projet peut rencontrer des difficultés, notamment les suivantes :

- Une adoption lente par les utilisateurs (besoin de formation)
- Une surcharge temporaire de la DSI pendant le déploiement
- L'importance d'organiser le support technique de manière optimale

Cependant, ces risques sont identifiés et peuvent être maîtrisés grâce au plan d'accompagnement.

Pour terminer, nous pouvons dire que la mise en place de Microsoft 365 est cohérent avec la stratégie de l'entreprise.

2.4.2. Faisabilité

Une analyse structurée a été menée à l'aide d'une matrice de faisabilité, évaluant le projet selon quatre dimensions : stratégique, technique, opérationnelle et économique/sociale.

Les résultats montrent que le projet est stratégiquement aligné, techniquement maîtrisé et opérationnellement solide.

Seul le volet économique présente moins de lisibilité, ce qui est attendu pour un projet interne sans génération de revenus directs.

Nom / Code projet	PMP_O365_06_2025	Date de création	18/06/2025

Critères d'évaluation		Pondération	Evaluation	Valeur	Moyenne / 5
Faisabilité stratégique					
	Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'organisation	4	tout à fait d'accord	20	4,6
	Le projet est aligné avec les valeurs de l'organisation	4	tout à fait d'accord	20	
	Le projet répond à un besoin clairement défini	5	plutôt d'accord	20	
Faisabilité technique et légale					
	Le projet répond aux réglementations en vigueur	5	Tout à fait d'accord	25	4,5
	Les technologies utilisées sont sûres et confirmées	3	plutôt d'accord	12	
	Les équipements, outils et logiciels nécessaires sont rapidement disponibles	4	plutôt d'accord	16	
	Il existe déjà des projets de ce type exécutés dans le monde professionnel	1	tout à fait d'accord	5	
Faisabilité opérationnelle					
	Les activités et coûts de maintenance sont identifiés	2	plutôt d'accord	8	4,8
	L'impact sur les opérations existantes est identifié et acceptable	2	tout à fait d'accord	10	
	Les besoins en formations sont identifiés et peuvent être réalisé	4	tout à fait d'accord	20	
Faisabilité économique et sociale					
	La première estimation des coûts ne dépasse pas dans le budget initial défini	3	plutôt d'accord	12	3,9
	Le retour d'investissement est conforme aux règles de l'organisation	1	Neutre / Moyennement d'accord	3	
	Les coûts et bénéfices sont clairement identifiables et mesurables	3	Plutôt d'accord	12	

Choix	Valeur
tout à fait d'accord	5
plutôt d'accord	4
Neutre / Moyennement d'accord	3
plutôt pas d'accord	2
pas du tout d'accord	1

Afin d'évaluer les atouts, faiblesses, une analyse SWOT a été réalisée.

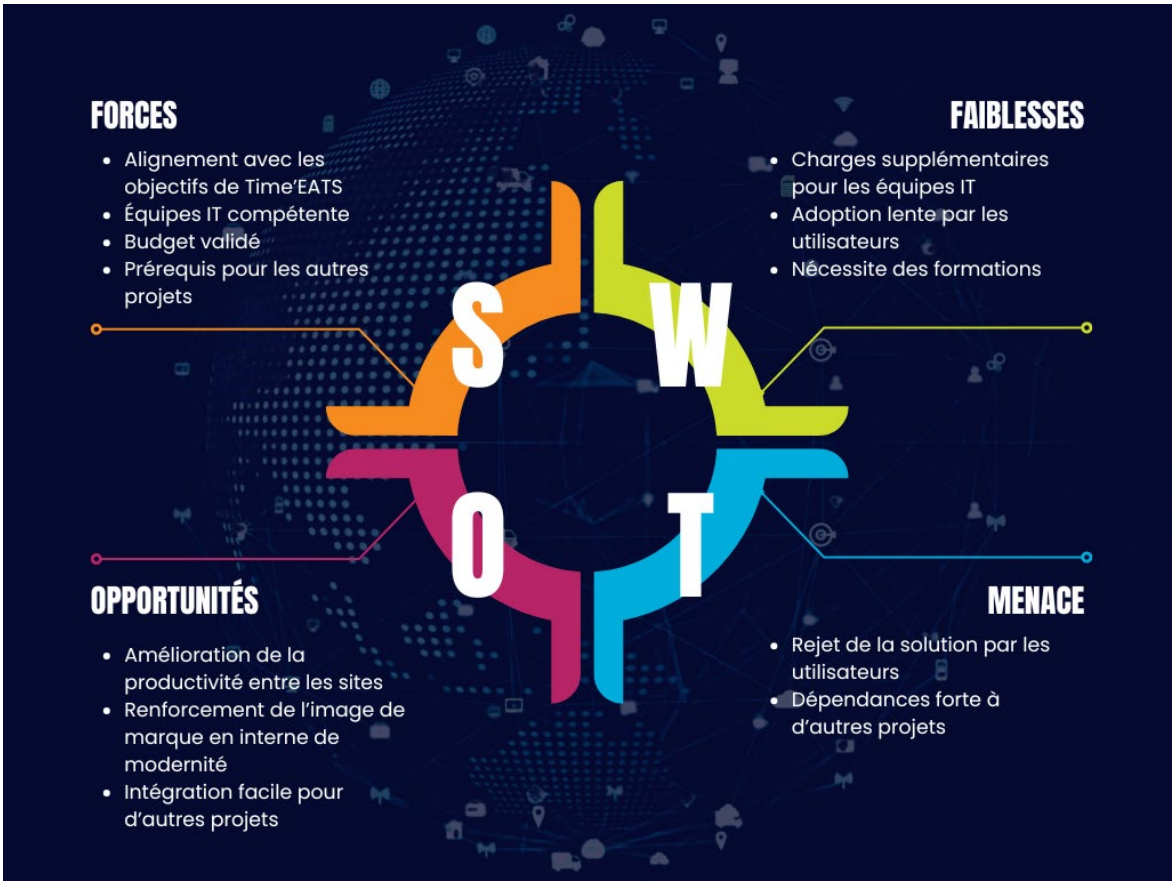

2.4.3. Le ROI

Même s'il ne génère pas directement de revenus supplémentaires ni de facturation externe, ce projet présente un retour sur investissement, en particulier sur les aspects organisationnels, humains et stratégiques.

En effet, la modernisation de l'environnement bureautique et collaboratif apportera plusieurs bénéfices concrets :

- Une amélioration de l'image de l'entreprise, tant en interne qu'en externe, en affichant une organisation moderne, alignée avec les besoins numériques et en améliorant la qualité de vie au travail

- Un gain de temps grâce à des outils mutualisés, sur les tâches quotidiennes (partage de documents, organisation de réunions, communication entre sites), permettant aux équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée

- Une meilleure collaboration et cohésion entre les sites géographiquement dispersés (Rennes, Morlaix, Concarneau)

- Une réduction des incidents techniques liés aux anciens outils, et donc une diminution de la frustration des utilisateurs et de la charge de travail pour l'équipe support informatique

Le projet contribue alors pleinement à la création de valeur pour l'entreprise, en renforçant son efficacité, son image et sa capacité à se transformer dans un environnement en pleine expansion.

3. Objectifs et périmètre du projet

3.1. Objectifs

L'objectif principal est d'offrir à tous les collaborateurs au plus tard deux mois après le démarrage du projet, un environnement bureautique cohérent et sécurisé. Ce projet vise à moderniser cet environnement en centralisant la gestion des comptes et des échanges.

Les objectifs opérationnels sont :

- Uniformiser les outils utilisés par les différents sites et services
- Simplifier l'accès aux fichiers, échanges et réunions à distance
- Réduire les incidents liés aux outils actuels par une plateforme
- Améliorer les conditions de travail et l'efficacité des équipes

Afin d'évaluer l'efficacité du projet et d'en assurer le pilotage, des KPI ont été définis. Ces indicateurs permettent de mesurer l'atteinte des objectifs. À cette fin, nous aurons recours à la méthode SMART.

Source : https://www.ionos.fr/startupguide/productivite/methode-smart/

Les indicateurs sont les suivants :

- Adoption des outils collaboratifs
  - 80 % des utilisateurs doivent avoir utilisé Teams et OneDrive au moins 5 fois chacun dans les 30 jours suivant le déploiement

- Formation des utilisateurs
  - 100 % des collaborateurs doivent avoir suivi une formation Office 365 (présentiel ou e-learning) avant la fin du mois de déploiement

- Respect du planning
  - Le projet doit être clôturé en respectant la durée prévue de 2 mois sans décalage sur les jalons majeurs

- Taux de satisfaction post-projet supérieur à 80 %
  - Obtenir un taux de satisfaction des utilisateurs supérieur à 80 % dans l'enquête menée dans le mois suivant le déploiement, sur la base d'un questionnaire (le questionnaire est en annexe)

3.2. Définition du périmètre

Le projet comprend les éléments suivants :

- Création et configuration des comptes Microsoft 365 pour tous les employés

- Migration de la messagerie existante vers Outlook

- Déploiement et paramétrage des principaux outils de la suite office
  - Microsoft Teams pour la communication, les visioconférences et la collaboration
  - OneDrive Entreprise pour le **stockage personnel** de fichiers dans le cloud
  - Word, Excel et PowerPoint pour les usages bureautiques, accessibles via le cloud et en version applicative si nécessaire

- Accompagnement au changement : support, documentation, formation des utilisateurs

- Application des règles de suppression automatique des documents (par exemple, les fichiers obsolètes (doc, ppt ,xls ,etc …))

- Gestion des versions pour les documents

Les éléments suivants sont volontairement exclus, car concernés par d'autres projets en parallèle :

- Mise en place de l'authentification forte
- Système de gestion des fichiers centralisé ou interservices
- Sauvegarde cloud et politique de rétention avancé
- Migration vers Microsoft Azure des serveurs et services internes,

Les éléments exclus ne relèvent pas directement de ce PMP, car ils font l'objet de projets parallèles.

3.3. Livrables attendus

Ce projet doit aboutir à la mise à disposition d'un environnement numérique, performant et adapté aux besoins quotidiens des collaborateurs de Time'Eats.

L'un des premiers résultats concrets attendus est la création et l'activation des comptes Microsoft 365 pour l'ensemble du personnel, permettant une transition rapide vers les nouveaux outils. Chaque utilisateur devra pouvoir accéder à son espace personnel sécurisé et aux applications en ligne.

La migration complète de la messagerie vers Outlook constitue également un livrable. Cela inclut non seulement le transfert des données existantes comme les e-mails, contacts, calendriers, mais aussi la mise en place des redirections nécessaires, la gestion des boîtes partagées et l'assurance d'une continuité de service sur tous les supports, y compris mobiles.

Le déploiement des outils bureautiques, en particulier Word, Excel et PowerPoint, viendra compléter cet environnement. L'accès pourra se faire via les postes locaux ou en mode cloud, selon les profils utilisateurs. Microsoft Teams pour la communication, jouera un rôle dans l'organisation des échanges et des réunions.

Afin de faciliter la prise en main des outils, des formations sont également prévus : guides utilisateurs, tutoriels, supports de formation ciblés selon les métiers, ainsi qu'une communication interne claire pour annoncer les étapes du projet et valoriser les nouveaux usages. Des réunions viendront valider la conformité de l'ensemble du dispositif mis en place, sur la base des critères définis en amont.

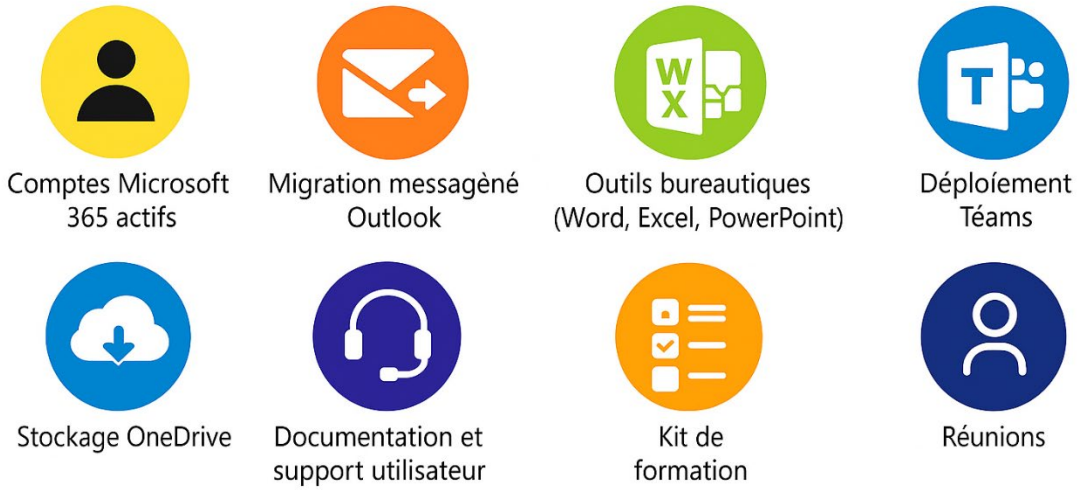

3.4. Critères de succès

Un premier critère de succès est le respect des délais prévisionnels. Le projet étant planifié sur deux mois, toute dérive majeure remettrait en cause la coordination avec les autres projets.

Ensuite, la mise en service effective des outils pour 100 % des collaborateurs est attendue. Cela comprend l'accès aux comptes Microsoft 365, la mise en place d'Outlook, Teams, OneDrive, ainsi que la disponibilité des outils bureautiques.

La réduction des incidents liés aux outils bureautiques est également un signal positif. Une diminution d'au moins 30 % des tickets de support technique relatifs aux problèmes bureautiques dans les trois mois suivant la mise en production sera considérée comme une réussite.

Enfin, un taux de satisfaction supérieur à 80 % des utilisateurs internes, mesuré via une enquête en ligne à la fin du projet sera mis en place.

Pour réussir ce projet, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre le budget, le temps disponible et périmètre du projet. Ces trois éléments font référence au triangle d'or.

Dans notre cas, nous avons un budget limité à 100 000 €, une durée de deux mois, et des livrables bien définis comme la messagerie, les outils bureautiques et la formation.

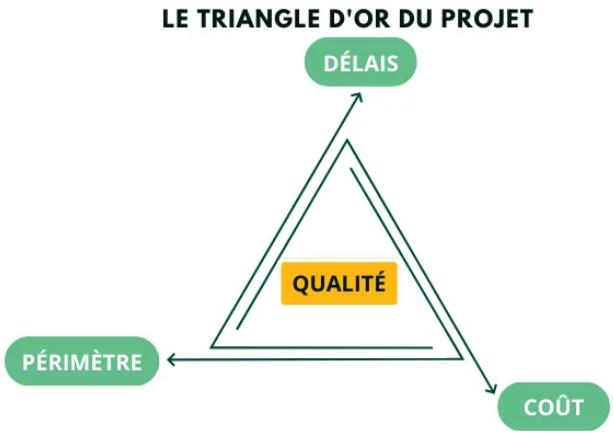

Source : https://blog-gestion-de-projet.com/triple-contrainte/

4. Priorisation de ce projet

La priorité de ce projet repose sur une analyse multicritère, permettant de comparer objectivement les projets entre eux et en fonction du besoin de Time'Eats.

Le projet se distingue par son importance stratégique, il est tout aussi important, car sa mise en œuvre conditionne la bonne préparation des autres chantiers.

De plus, la complexité technique du projet est maîtrisée et la DSI dispose en interne de la majorité des compétences nécessaires pour sa réalisation. Son coût est connu, avec un budget validé. Il est par conséquent réaliste et peut être accompli dans les délais prévus

5. Organisation du projet

5.1. Parties prenantes du projet

Voici la liste des principales parties prenantes identifiées :

- DG : Responsable de la vision stratégique et de validation du projet
- DSI / RSSI : Supervise le projet, assure la conformité technique et sécuritaire, et pilote l'intégration dans le système d'information
- Chef de projet IT (cellule PMO) : Responsable de la coordination opérationnelle et du pilotage global du projet
- Techniciens informatiques : Chargés de la mise en œuvre technique sur le terrain (installation, paramétrage, assistance)

- Administrateurs systèmes et réseaux : Responsables des infrastructures, de l'intégration dans l'environnement réseau, et de la configuration des services cloud

- Développeurs logiciels et lead développeurs : Indirectement impliqués dans ce projet, mais mobilisables ponctuellement pour des automatisations simples si besoin avec Power Automate par exemple

- Utilisateurs internes (salariés de tous services) : Bénéficiaires directs des outils, leur retour d'expérience est essentiel pour avoir leurs ressentis

- Comité projet : Réunis des représentants de la direction, de la DSI et du pilotage projet, pour prendre des décisions stratégiques

5.2. Matrice RACI

Une matrice RACI a été définie. Elle précise, pour chaque grande tâche du projet :

- R pour Réalisateur, c'est donc la personne ou l'équipe qui exécute la tâche

- A pour Approbateur, c'est la personne qui valide la tâche ou le livrable

- C pour Consulté, c'est la personne sollicitée pour son avis ou expertise

- I pour Informé, c'est la personne à tenir informée du suivi de la tâche

Cette répartition permet de voir les responsabilités de chacune des parties prenantes tout au long du projet.

Voici une version succincte, comprenant uniquement les grands axes de la matrice RACI.

ID	Livrable ou tâche	Direction	DSI / RSSI	Chef de projet	Administrateurs IT	Techniciens IT	Utilisateurs
1	Lancement et cadrage du projet	C	A	R	I	C	I
2	Paramétrage et configuration de Microsoft 365	I	C	C	A	R	I
3	Migration des services existants	I	C	C	A	R	I
4	Déploiement des outils bureautiques	I	C	C	A	R	I
5	Accompagnement des utilisateurs	I	C	R	I	A	C
6	Suivi post-déploiement et clôture	I	A	R	C	I	C

5.3. Organigramme projet

L'organigramme ci-dessous présente la structure projet mise en place pour le déploiement d'Office 365 au sein de Time'Eats. Il montre la hiérarchie lors de ce projet.

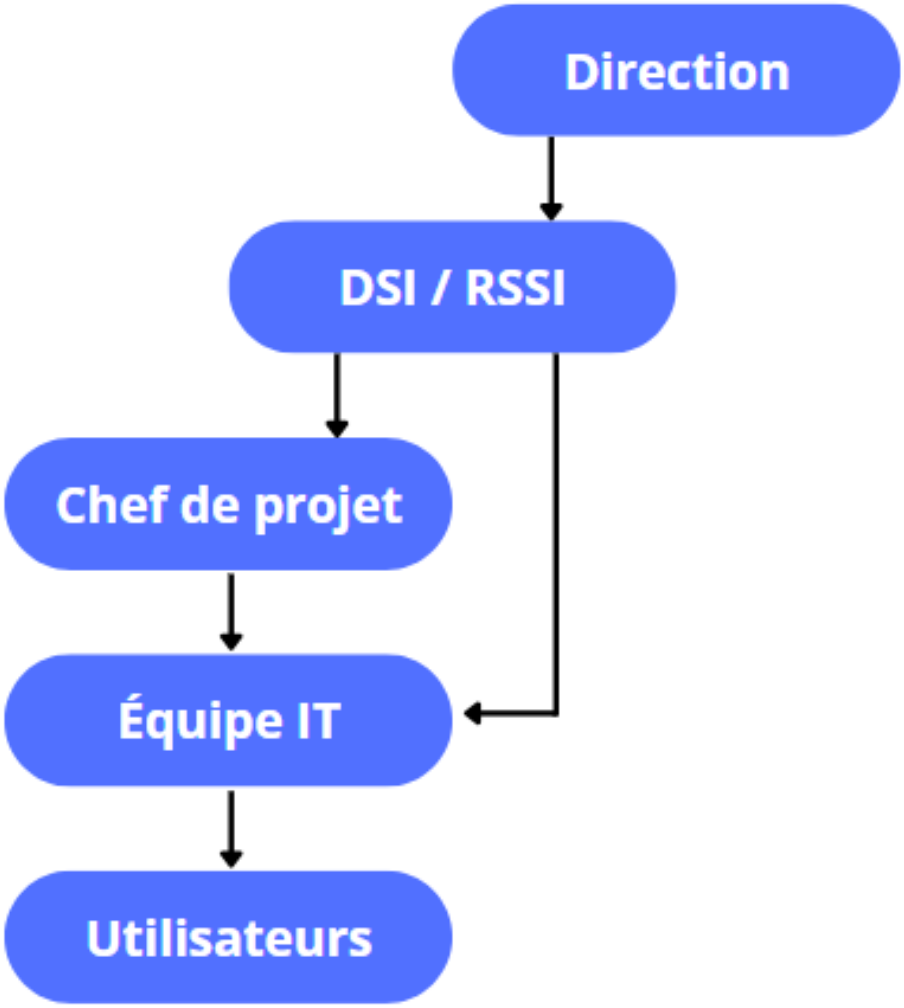

6. Planning prévisionnel

6.1. Les grandes phases

Le projet suit une méthode de gestion de cycle en V, une progression étape par étape. Chaque phase est importante et conditionne la suivante, même si certaines tâches peuvent se chevaucher lorsque les ressources le permettent.

Voici les grandes étapes du déroulé prévu.

Analyse et cadrage du projet

Cette phase permet de définir précisément les objectifs, les besoins, les contraintes et les parties prenantes du projet. Nous validons à ce moment les périmètres, les critères de succès et les outils à mettre en œuvre. Un comité de lancera le début officiel du projet, c'est donc l'objet de ce PMP.

Paramétrage de Microsoft 365

Une fois le périmètre défini, l'équipe IT procède à la configuration de Microsoft 365 (comptes, messagerie, OneDrive, Teams, etc.). Cela comprend les licences, la création des environnements et la mise en place des règles générales (qui peux mettre quoi dans son OneDrive par exemple).

Mise en place d'une plateforme de test

Un environnement de test sera configuré pour servir de terrain d'expérimentation. Elle permet de valider les paramétrages techniques, de simuler les usages et de recueillir les premiers retours des utilisateurs.

Phase pilote avec des utilisateurs référents

Un groupe d'utilisateurs "pilote" (issus de différents services et profils) teste l'environnement, dans des conditions proches du réel. Cette phase est essentielle pour ajuster certains éléments avant le déploiement général.

Déploiement à l'ensemble de l'organisation

Après validation, les outils sont mis à disposition de tous les collaborateurs, de manière progressive ou simultanée selon la stratégie retenue. Cette étape inclut la migration des boîtes mail et la mise en place des services bureautiques.

Formation et accompagnement des utilisateurs

Afin d'optimiser les ressources des équipes IT mobilisées sur le projet nous avons décidé de former un groupe pilote restreint, constitué d'utilisateurs référents issus des différents services. Ces utilisateurs auront ensuite pour rôle d'accompagner et former leurs collègues en interne, avec des supports fournis par l'équipe projet.

Clôture et retour d'expérience

Une fois le déploiement stabilisé, le projet entre en phase de clôture, un bilan sera organisé, les KPI seront évalués, et les enseignements seront partagés avec les équipes DSI. Cela permet aussi de capitaliser pour les projets futurs.

6.2. Durée et les jalons clés

Le projet et composé de sept phases principales. Chaque phase à une durée estimée. Accompagné d'un diagramme de PERT (Program Evaluation and Review Technique), en tenant compte des scénarios optimiste, réaliste et pessimiste. La durée totale du projet est estimée à environ 42 jours ouvrés, ce qui permet un pilotage sur 2 mois, en intégrant la possibilité de réaliser certaines activités en parallèle lorsque les ressources le permettent. Le tableau ci-dessous montre la durée en détail ainsi que les jalons.

Phase	Durée estimée (TE) en J	Jalon associé	Ressources mobilisées
Analyse et cadrage du projet	5	Comité de lancement validé	1 chef de projet
Paramétrage de Microsoft 365	8,3	Paramétrage validé par la DSI	2 techniciens et 1 administrateur
Mise en place d'une plateforme de test	5	Plateforme de test opérationnelle	1 technicien et 1 administrateur
Phase pilote avec utilisateurs pilote	5	Retour utilisateur pilote	1 chef de projet et 1 technicien
Déploiement à l'ensemble de l'organisation	10	Déploiement final terminé	3 techniciens et 1 administrateur
Formation et accompagnement utilisateurs référents	5	Formations des utilisateurs référents	1 chef de projet et 1 technicien
Clôture et retour d'expérience	4	Bilan projet présenté	1 chef de projet
Total estimé (TE)	**42,3**		

6.3. Diagramme de GANT et PERT

Pour planifier ce projet, nous avons utilisé deux outils supplémentaires : le diagramme de Gantt, qui représente graphiquement les tâches dans le temps, et un diagramme de PERT, qui permet de visualiser les dépendances entre les activités et d'identifier le chemin critique du projet

Le diagramme de Gantt ci-dessous reprend les grandes étapes du projet, en tenant compte de la durée estimée de chaque phase (issues de l'analyse réalisé juste avant).

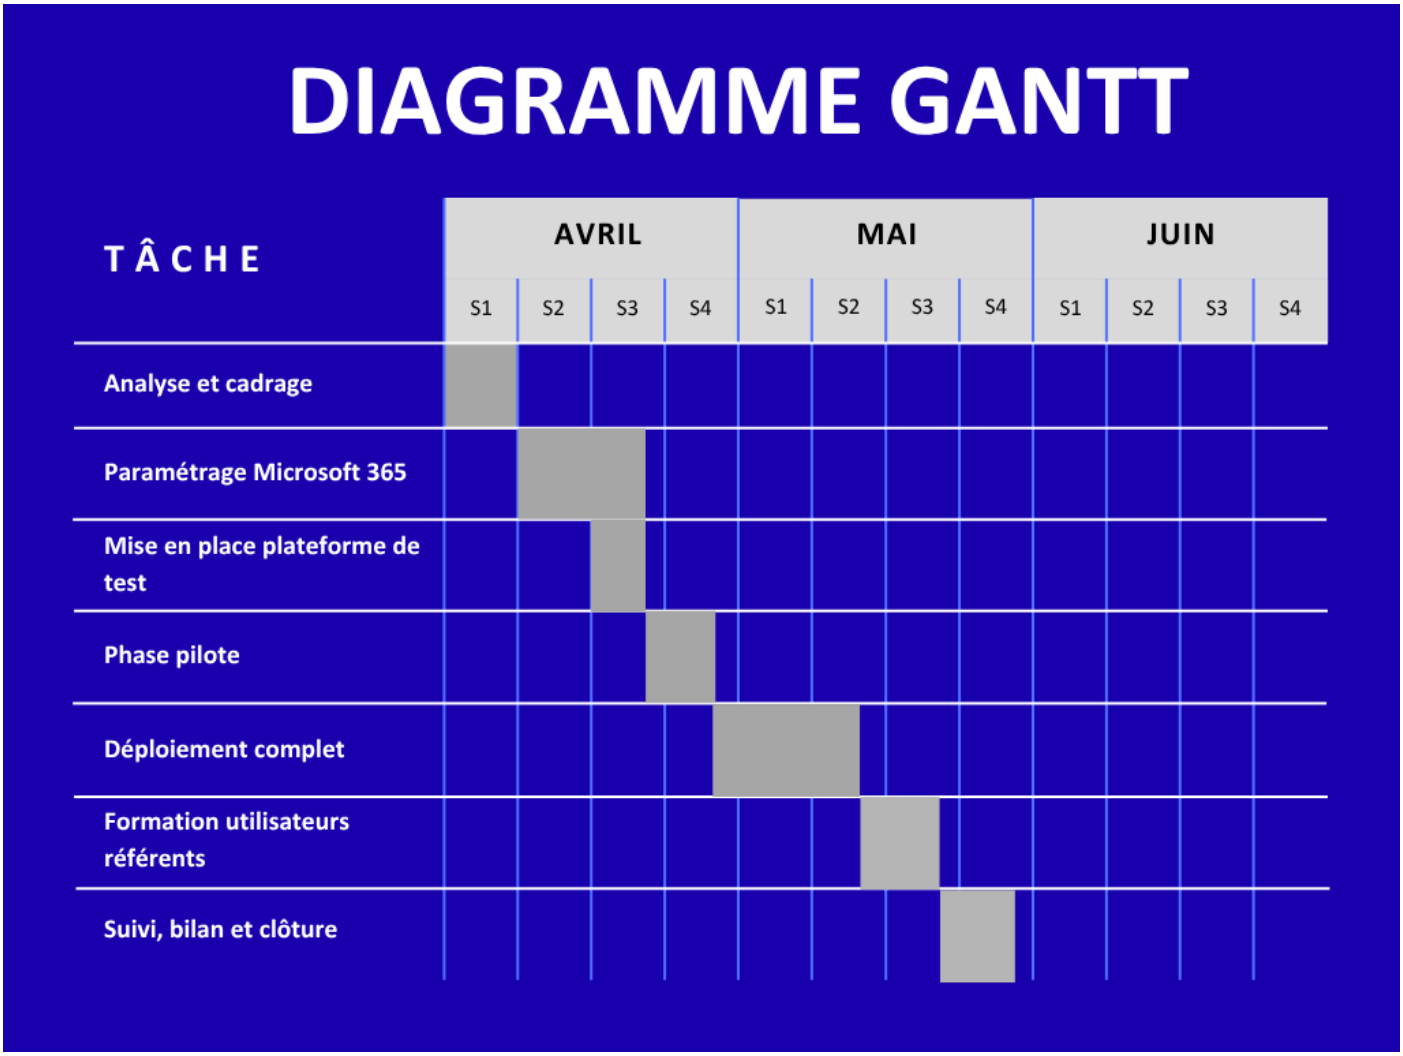

Dans le but de clarifier la planification, le diagramme de PERT ci-dessous présente les grandes étapes du projet, accompagnées des jalons clés et des dates estimées. Cette vue permet de situer dans le temps l'enchaînement des tâches, tout en identifiant les éventuels chevauchements occasionnés par l'organisation des ressources.

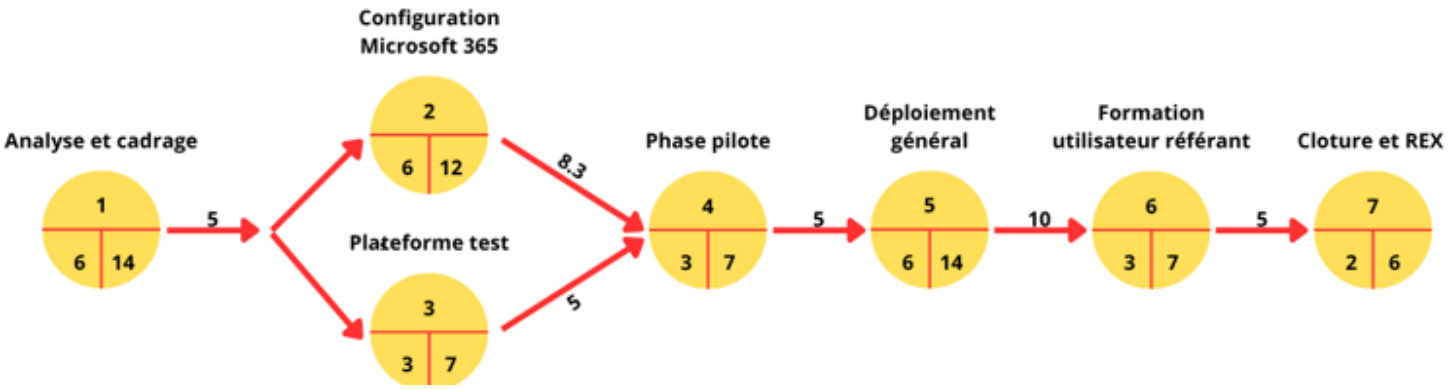

Légende :

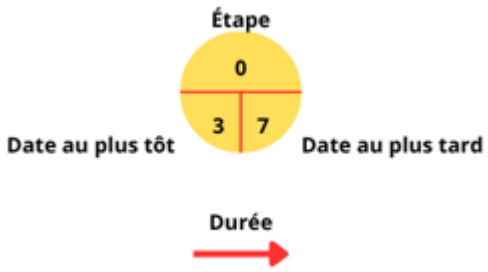

7. Gestion des coûts

7.1. Budget prévisionnel

Le coût d'un projet correspond à l'ensemble des ressources financières nécessaires à la réalisation des différentes tâches et livrables. Dans le cadre de ce projet, les coûts sont structurés selon plusieurs catégories :

- Les coûts directs, ce sont les dépenses liées directement aux activités du projet (salaires, licences Microsoft 365, matériel spécifique…)

- Les coûts indirects, ce sont les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du projet mais non liées à une tâche spécifique (gestion administrative, support, etc …)

- Les coûts fixes, ce sont des dépenses indépendantes de la durée ou du périmètre du projet (location d'outils, plateforme collaborative, etc …)

- Les coûts variables, ce sont les dépenses évolutives selon la charge et le périmètre (comme le volume de licences, le nombre d'intervenants, etc …)

Afin de structurer et estimer le budget, nous nous sommes appuyés sur un WBS (Work Breakdown Structure) détaillant les grandes phases du projet et les charges associées (voir ci-après). Chaque point mobilise un ou plusieurs professionnels (chef de projet, technicien IT, administrateur IT), avec un Taux Journalier Moyen défini ainsi :

Fonction	TJM (€)
Chef de projet	400 €
Technicien IT	250 €
Administrateur IT	300 €

7.2. WBS

Et voici le WBS que nous avons réalisé (une version plus lisible est disponible en annexe).

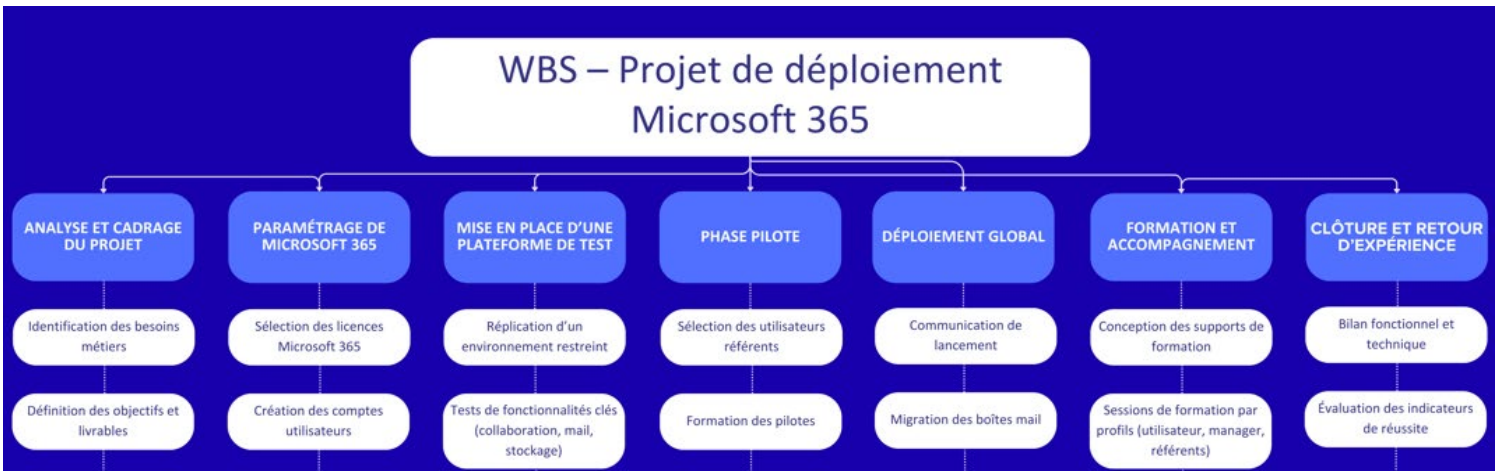

7.3. Estimation des coûts humains

À partir de ce découpage, nous avons évalué les charges humaines utilisée par phase (en jours-hommes), et grâce aux durées estimées par le PERT avec le nombre de profils mobilisés (chefs de projet, techniciens, administrateurs). L'objectif est de respecter l'enveloppe fixée à 220 jours-hommes. Pour ce faire, prenons le dernier tableau réaliser avec le temps estimé et nous l'avons adapté en ajoutant la charge estimée.

Phase	Durée estimée (TE) en J	Ressources mobilisées	Charges estimée (J/H)
Analyse et cadrage du projet	5	1 chef de projet	5
Paramétrage de Microsoft 365	8,3	2 techniciens et 1 administrateur	25
Mise en place d'une plateforme de test	5	1 technicien et 1 administrateur	10
Phase pilote avec utilisateurs pilote	5	1 chef de projet et 1 technicien	10
Déploiement à l'ensemble de l'organisation	10	3 techniciens et 1 administrateur	40
Formation et accompagnement utilisateurs référents	5	3 techniciens et 1 administrateur	20
Clôture et retour d'expérience	4	1 chef de projet et 1 administrateur	8

Charges de pilotage		Réunion, reporting, suivi qualité, etc …	Total J/H * 20% = 118 *0.2 = 23.6 (environ 24)
Total estimé (TE)	**42,3**	**Total J/H**	142

Donc, nous pouvons voir que nous restons en dessous de l'enveloppe donnée, nous sommes à 142 J/H en prévision.

Le tableau ci-dessous présente l'estimation budgétaire associée aux charges humaines internes du projet.

Phase / Tâche principale	Personnels	Nb jours (TE)	TJM (€)	Coût estimé (€)
Analyse et cadrage du projet	1 Chef de projet	5	400	2000
Paramétrage de Microsoft 365	2 Techniciens, 1 Admin IT	8,3	800	6640
Mise en place d'une plateforme de test	1 Technicien, 1 Admin IT	5	550	2750
Phase pilote avec utilisateurs pilotes	1 Chef de projet, 1 Technicien	5	650	3250
Déploiement à l'ensemble de l'organisation	3 Techniciens, 1 Admin IT	10	1050	10500
Formation et accompagnement utilisateurs référents	1 Chef de projet, 1 Technicien	5	650	3250
Clôture & retour d'expérience	1 Chef de projet	4	400	1600
Charge de pilotage (20% effort)	1 Chef de projet	8,5	400	3400
			Total	**33 390 € TTC**

Chef de projet	400
Technicien IT	250
Administrateur IT	300

7.4. Budget Global

Pour terminer, voici un tableau synthétique qui regroupe le budget prévisionnel total :

Catégorie de coût	Montant estimé (€)
Charges humaines interne (tableau ci-dessus)	33 390 €
Licences Microsoft 365	86 736 €
Matériel informatique complémentaire	3 000 €
Marge de sécurité budgétaire (environ 5 % du budget total HT)	6 240 €
Total budget prévisionnel	**126 666 € TTC**
Total à payer chaque année post déploiement	**86 736 € TTC**

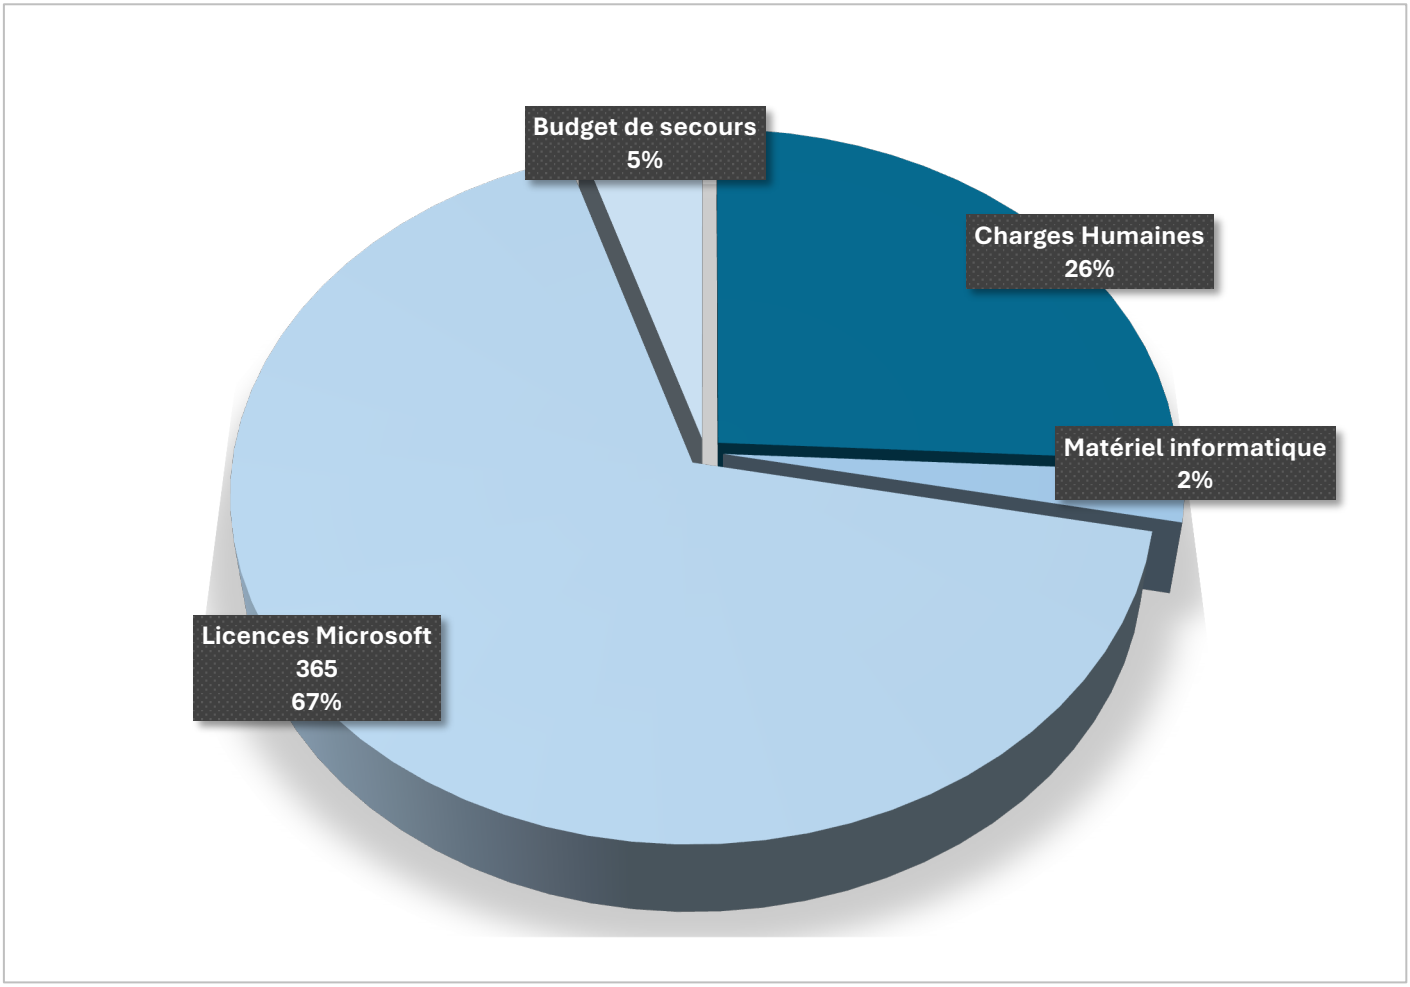

Nous pouvons voir grâce à ce graphique, que les licences Microsoft représentent une partie importante du budget total, soit 67%.

8. Communication

La communication est importante lors d'un projet. Elle s'articule autour d'un plan de communication.

8.1. Plan de communication

Le plan de communication a pour but, de transmettre les bonnes informations, au bon moment, aux bonnes personnes. Voici un aperçu rapide du plan de communication, la version complète est disponible en annexe.

Cible	Objectif	Contenu	Canal	Fréquence
Équipe projet	Coordination, pilotage	Avancement, risques	Réunion	Hebdomadaire
DSI / Direction générale	Reporting stratégique	KPI, alertes, jalons, livrables	Réunion de pilotage, tableau de bord	Toutes les 2 semaines
Référents métiers	Accompagnement au changement	Avancées, impacts, formation	Réunion	Toutes les 2 semaines
Utilisateurs finaux	Information	Présentation du projet, bénéfices	Email, affiche	1 fois par phase

8.2. Réunions

Des réunions de point permettent d'assurer un suivi régulier du projet.

Instance	Périodicité	Participants	Objectif principal
Comité projet	Toutes les 2 semaines	Équipe projet	Suivi opérationnel, gestion des actions
Comité de pilotage	Mensuelle	DSI, Direction, Chef de projet	Point d'étape global
Réunion référents utilisateurs	À chaque jalon	Référents + équipe projet	Transmission d'info et retour
Réunion de lancement / clôture	En début et fin	Tous les acteurs	Bilan final

8.3. Support de formation

Support	Public cible	Format	Moment de diffusion
Communication du lancement	Tous	PDF, intranet	Phase de lancement
Guides et tutoriels Microsoft 365	Utilisateurs finaux	PDF + vidéos courtes	Avant le déploiement global
Support de formation référents	Référents internes	Présentation + QCM	Avant la phase pilote
Sessions de formation live	Référents / utilisateurs	Visio ou présentiel	Déploiement global
FAQ + support sur Teams	Tous	Canal dédié + messagerie	Durant 3 mois post-déploiement

9. Les KPI

Pour rappel, les indicateurs ont été définis en lien avec les objectifs du projet et permettront d'évaluer la qualité du déploiement et l'adoption des solutions par les utilisateurs.

Indicateur	Cible	Moment de mesure
Adoption des outils collaboratifs	80 % des utilisateurs doivent avoir utilisé Teams et OneDrive au moins 5 fois chacun	1 mois après déploiement
Formation des utilisateurs	100 % des collaborateurs doivent avoir suivi une formation Office 365 (présentiel ou e-learning)	Avant les 2 mois post déploiement
Respect du planning	Projet clôturé en respectant la durée prévue de 2 mois sans décalage sur les jalons majeurs	À la clôture du projet
Taux de satisfaction post-projet	Taux de satisfaction ≥ 80 % dans l'enquête menée le mois suivant le déploiement	1 mois après déploiement

Le questionnaire de satisfaction est disponible en annexe.

10. Gestion des risques

La gestion des risques vise à anticiper les événements pouvant impacter le bon déroulement du projet. Une première analyse a permis d'identifier les risques importants, leurs impacts potentiels, et les actions à réaliser en mesure palliative.

ID	Risque	Impact potentiel	Probabilité	Gravité	Score	Mesures préventives	Probabilité	Gravité	Score
1	Conflit de priorité avec d'autres projets internes	Retard du calendrier global	Moyenne 3	Modérée 3	9	Anticipation du planning multi-projets	Faible 2	Faible 2	4
2	Dépassement du budget alloué	Suspension de certaines phases du projet	Élevée 4	Élevée 4	16	Suivi budgétaire hebdomadaire, réserve de 5%	Moyenne 3	Moyenne 3	9
3	Non-conformité RGPD ou hébergeur non certifié	Amendes, blocage juridique	Faible 2	Élevée 4	8	Validation juridique des contrats fournisseurs	Faible 2	Moyenne 3	6
4	Manque de disponibilité des utilisateurs référents	Retard d'adoption, validations reportées	Moyenne 3	Moyenne 3	9	Planning des tests/formations	Faible 2	Moyenne 3	6
5	Départ d'un chef de projet ou expert	Pertes de connaissance, ralentissement du projet	Faible 2	Critique 5	10	Double pilotage temporaire, documentation systématique	Faible 2	Élevée 4	8

Le tableau complet d'évaluation des risques est présenté en annexe.

Ci-dessous figure la matrice des risques, associée au tableau de gestion des risques. Elle offre une représentation plus claire et graphique de la situation telle qu'elle a été évaluée.

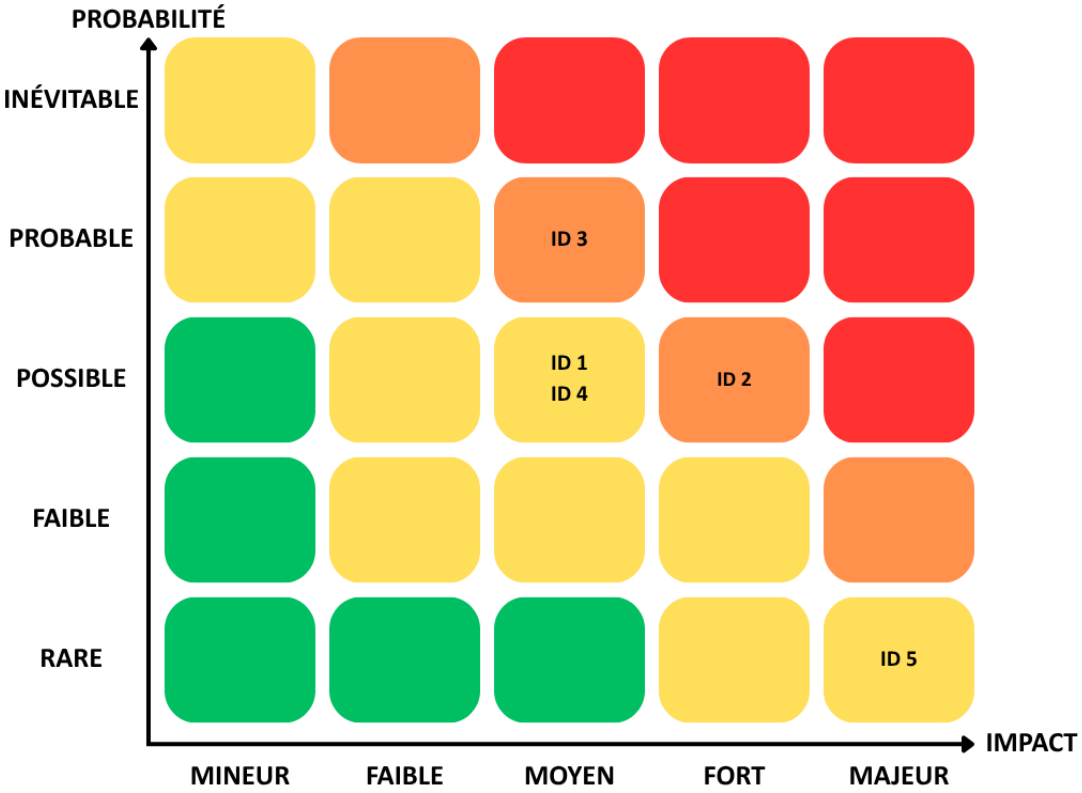

11. Plan de tests et recette

Le plan de tests a pour objectif de s'assurer que les livrables techniques et fonctionnels répondent aux exigences spécifiées et que la solution déployée fonctionne correctement. Cela permet de valider la qualité et la conformité du projet avant sa généralisation.

11.1. Les tests techniques

Les tests techniques ont pour objectif de valider le fonctionnement de l'environnement Microsoft 365. Donc, sur la création des comptes, la synchronisation des boîtes mail Outlook et l'accès à OneDrive.

Ils sont menés par l'équipe IT. Des tests de performance sont également prévus pour mesurer les temps de réponse et la capacité à supporter des usages simultanés, comme l'ouverture de plusieurs sessions ou le transfert de fichiers lourds. L'administrateur système et réseau est en charge de cette phase.

Les tests fonctionnels permettent de vérifier que les principales fonctionnalités répondent bien aux attentes métier. Par exemple, organiser une réunion Teams, partager un document via OneDrive ou naviguer dans les canaux Teams.

Les utilisateurs référents ou pilotes valident ces cas d'usage. Enfin, des tests d'ergonomie permettent de vérifier que l'interface est claire, simple à utiliser et bien adaptée à tous les profils d'utilisateurs.

11.2. Critères de validation

Pour qu'un test soit considéré comme réussi, il doit respecter plusieurs critères.

La fonctionnalité doit être conforme à ce qui a été défini dans le cahier des charges :

- Aucun incident bloquant ne doit être constaté
- Les tests doivent être réalisés auprès des utilisateurs référent
- La DSI ou le comité de validation doit donner un avis favorable avant la mise en place générale

11.3. PV de recette

À l'issue des tests techniques et fonctionnels réalisés sur l'environnement Microsoft 365, un procès-verbal de recette est établi afin de vérifier la conformité du projet.

Les points suivants ont été évalués :

Élément validé	Commentaire
Accès utilisateurs	Création et connexion testées avec succès
Teams (réunion, chat, canaux)	Scénarios simulés avec utilisateurs pilotes
OneDrive (partage de fichiers)	Tests de sécurité et partage réalisés
Migration messagerie	Migration testée sur 10 comptes sans erreur
Documentation utilisateurs	Guides remis aux référents métiers

Le PV de recette complet est disponible en annexe.

12. Clôture du projet

La clôture du projet marque la fin officielle des travaux engagés dans le cadre du déploiement de Microsoft 365. Elle permet de s'assurer que tous les objectifs ont été atteints, que les livrables ont été validés, et qu'aucun point critique n'est en suspens. Donc cette partie sera complété à la fin du projet.

12.1. Bilan du projet

Une réunion de bilan sera organisée en présence des principales parties prenantes (DSI, chefs de projet, référents métiers). L'objectif est de :

- Vérifier la conformité des livrables aux attentes exprimées au lancement
- Comparer les résultats réels avec les indicateurs de succès définis (KPI)
- Identifier les écarts éventuels et leurs causes
- Évaluer la satisfaction des utilisateurs et de l'équipe projet

12.2. Capitalisation et REX

Afin de tirer des enseignements utiles pour les projets futurs, un document de retour d'expérience (REX) sera rédigé. Il comportera :

- Les points positifs du déroulement du projet
- Les difficultés rencontrées et les solutions apportées
- Les recommandations pour les futurs déploiements similaire

Ce document sera conservé au sein de la DSI comme ressource interne.

12.3. Archivage

Les éléments suivants seront archivés :

- Le Plan de Management de Projet (PMP)
- Le procès-verbal de recette signé
- Les comptes-rendus des comités

- La documentation utilisateur

Enfin, le projet sera formellement clôturé par la DSI. Cela inclut :

- La désactivation des accès projet (outils collaboratifs, plateformes test, etc …)

- La notification de fin aux équipes projet

Annexe

WBS

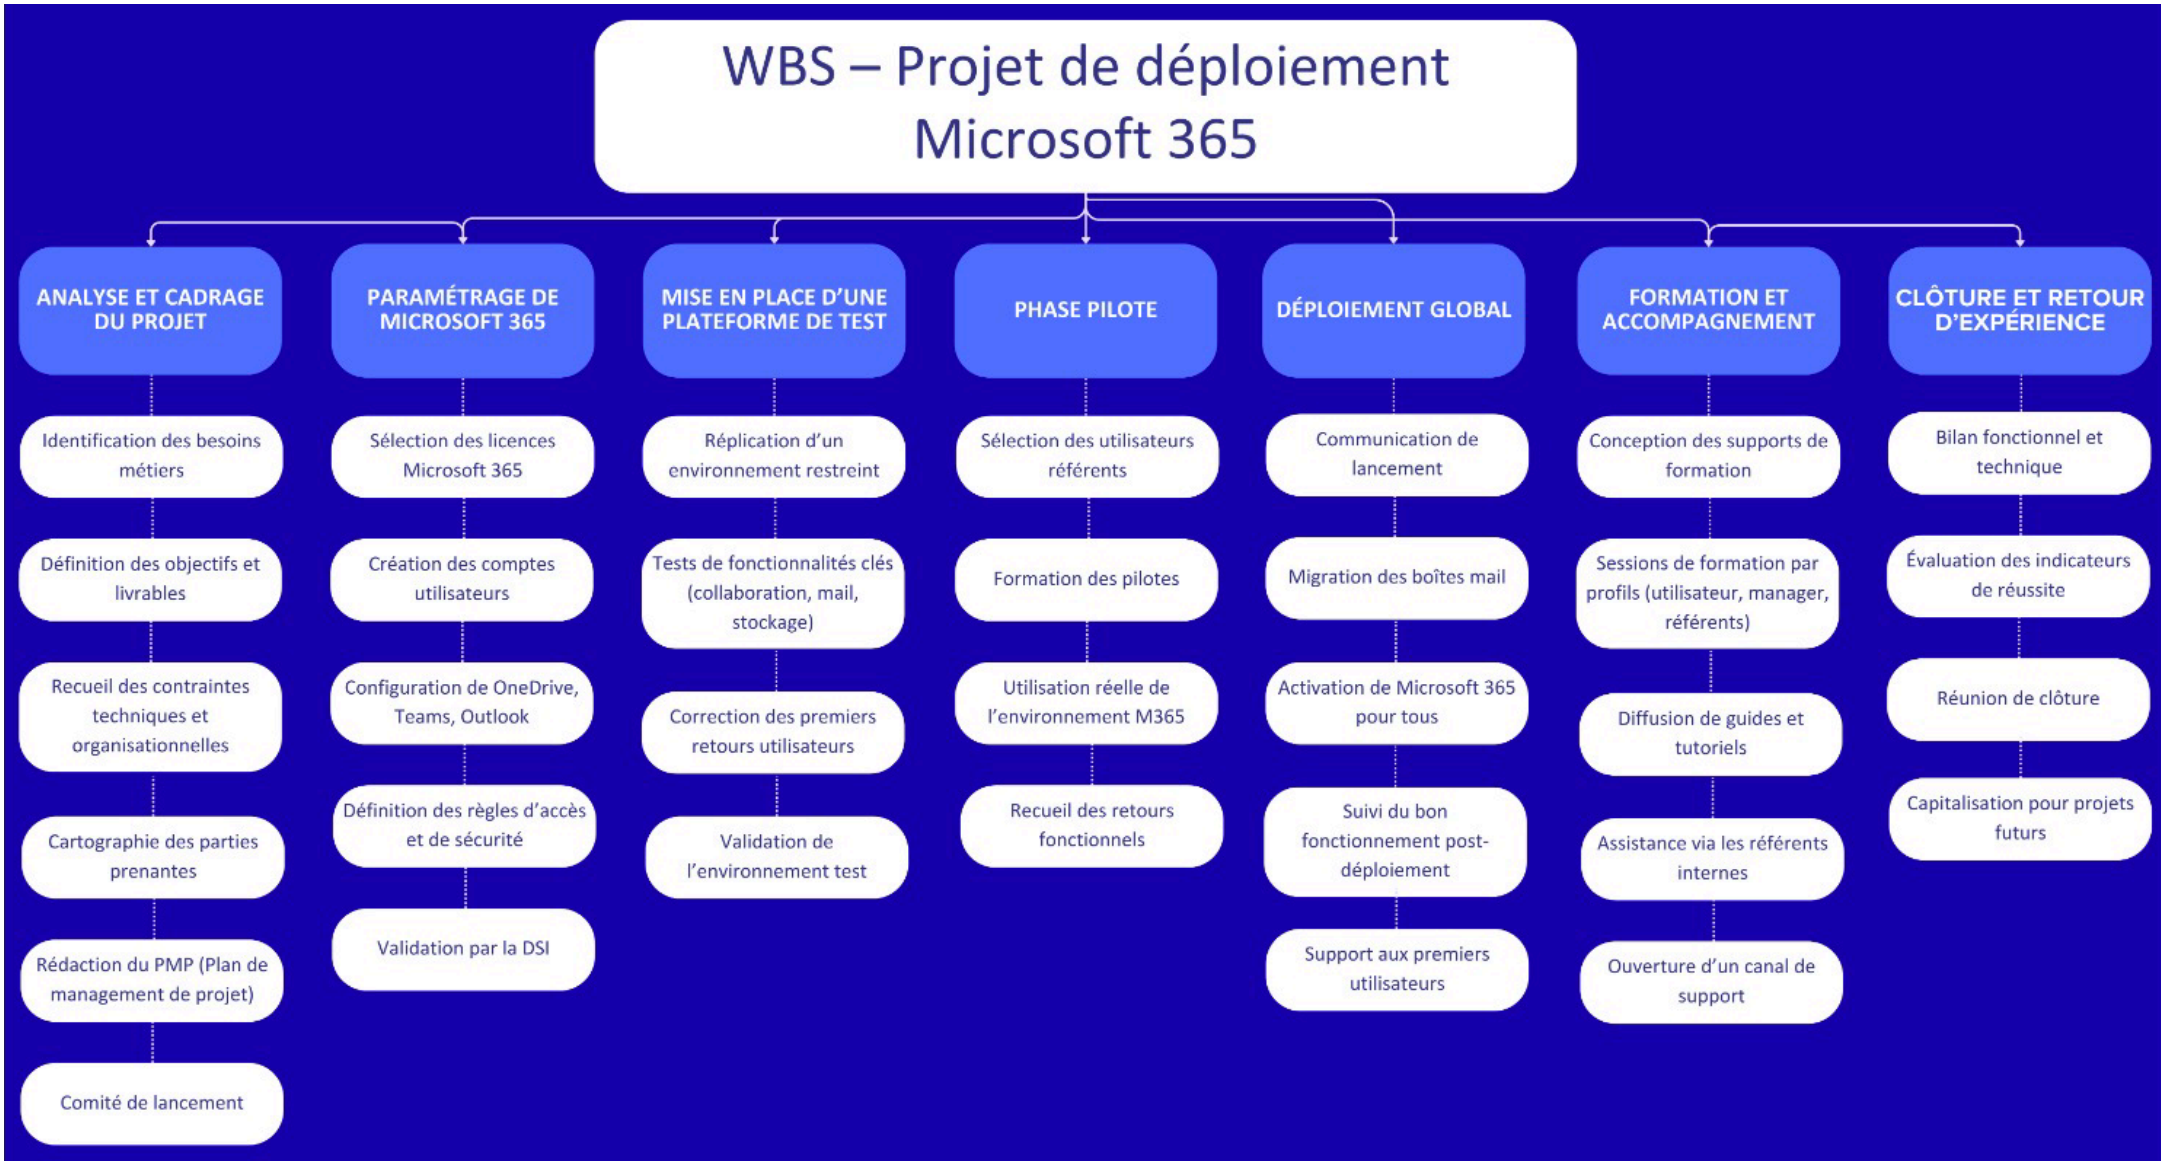
WBS – Projet de déploiement Microsoft 365
ANALYSE ET CADRAGE DU PROJET
Identification des besoins métiers
Définition des objectifs et livrables
Recueil des contraintes techniques et organisationnelles
Cartographie des parties prenantes
Rédaction du PMP (Plan de management de projet)
Comité de lancement
PARAMÉTRAGE DE MICROSOFT 365
Sélection des licences Microsoft 365
Création des comptes utilisateurs
Configuration de OneDrive, Teams, Outlook
Définition des règles d'accès et de sécurité
Validation par la DSI
MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE TEST
Réplication d'un environnement restreint
Tests de fonctionnalités clés (collaboration, mail, stockage)
Correction des premiers retours utilisateurs
Validation de l'environnement test
PHASE PILOTE
Sélection des utilisateurs référents
Formation des pilotes
Utilisation réelle de l'environnement M365
Recueil des retours fonctionnels
DÉPLOIEMENT GLOBAL
Communication de lancement
Migration des boîtes mail
Activation de Microsoft 365 pour tous
Suivi du bon fonctionnement post-déploiement
Support aux premiers utilisateurs
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Conception des supports de formation
Sessions de formation par profils (utilisateur, manager, référents)
Diffusion de guides et tutoriels
Assistance via les référents internes
Ouverture d'un canal de support
CLÔTURE ET RETOUR D'EXPÉRIENCE
Bilan fonctionnel et technique
Évaluation des indicateurs de réussite
Réunion de clôture
Capitalisation pour projets futurs

PLAN DE COMMUNICATION

Objectifs du plan de communication

Le plan de communication interne pour le déploiement de Microsoft 365 est conçu pour atteindre plusieurs objectifs :

- **Informer** : Assurer une communication transparente sur l'avancement du projet
- **Rassurer** : Apaiser les inquiétudes des collaborateurs concernant les impacts du changement
- **Accompagner** : Soutenir les utilisateurs tout au long du processus de déploiement
- **Favoriser** : Encourager l'utilisation de la nouvelle suite collaborative
- **Fluidifier** : Améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes.

Cibles

Le plan de communication s'adresse à plusieurs groupes au sein de l'organisation :

- **Tous les collaborateurs** : Les utilisateurs finaux qui utiliseront Microsoft 365
- **Référents métiers** : Ceux impliqués dans la phase pilote pour fournir des retours d'expérience
- **Chefs de projets** : Personne en charge de la gestion du projet
- **Équipe IT** : Administrateurs et techniciens responsables du support technique
- **Direction générale et DSI** : Ceux qui supervisent le déploiement

Canaux de Diffusion

Pour atteindre efficacement les cibles, plusieurs canaux de communication seront utilisés :

- **Mails internes** : Pour diffuser des annonces et effectuer le suivi du projet
- **Réunions d'équipes et comités projet** : Pour discuter de l'avancement et des défis du projet
- **Supports imprimés ou numériques** : Dans les espaces communs pour sensibiliser davantage

Fréquence

Le calendrier de communication est structuré pour s'adapter aux différentes phases du projet.

Période du projet	Type de communication	Fréquence
Cadrage / lancement	Annonce + réunion de lancement	Ponctuelle
Phase pilote / test	Infos ciblées aux référents	Hebdomadaire
Déploiement général	Infos générales à tous les utilisateurs	Tous les 3-4 jours
Formation	Guides + rappels de sessions	Avant chaque vague de formation
Clôture	Bilan, remerciements, retours	Ponctuelle

Formats Privilégiés

Pour maximiser l'efficacité de la communication, les formats suivants seront privilégiés :

- **Newsletters internes** : Présentant les informations de manière concise
- **Infographies** : Pour expliquer les fonctionnalités clés de manière visuelle
- **Vidéos de démonstration** : Pour montrer l'utilisation de Teams, OneDrive, etc
- **FAQ** : Contenant les réponses aux principales questions des utilisateurs
- **Guides de prise en main** : Disponibles en formats PDF
- **Sessions de questions/réponses** : Pour permettre aux utilisateurs de poser leurs questions directement.

Gestion des risques

Risques	Conséquences	Gravité	Fréquence	Criticité	Détectabilité	Criticité avec Détectabilité	% de risque	Parades
Stratégiques								
Conflit de priorité avec un autre projet interne	Retard de calendrier, surcharge des équipes	2	4	8	1	8	10	Anticiper le planning multi-projets, commité de suivi
Financiers								
Dépassement de budget	Projet gelé ou sous-financé	4	2	8	2	16	20	Suivi des dépenses, enveloppe de réserve de 5 %, arbitrages si besoin
Contractuels								
Données hébergées dans un datacenter non conforme	Amendes, non-conformité RGPD, risques juridiques	4	1	4	3	12	15	Vérification juridique du contrat d'hébergement
Technique								
Incompatibilité avec certains systèmes (OS, navigateurs…)	Impossibilité d'utiliser les outils M365	3	2	6	2	12	15	Phase de tests anticipée sur plateforme de test
RH								
Départ d'un expert ou d'un chef de projet	Perte de compétence, désorganisation	4	2	8	3	24	30	Faire de la documentation à chaque grande étape
MOE/MOA								
Faible disponibilité des utilisateurs référents	Retards dans les retours ou les validations	3	3	9	2	12	22,5	Mobiliser les référents en amont, planifier leurs disponibilités
Exigences / Cadrage								
Cadrage initial incomplet ou mal compris	Attentes non remplies, refonte partielle du projet	3	3	9	2	18	22,5	Réunion de cadrage
Formation								
Refus ou blocage du changement par les utilisateurs	Sous-utilisation des outils M365, retour en arrière	2	3	6	2	12	15	Communication, formations + appui des référents
Infrastructure								
Incident sur le réseau ou serveur interne	Impossibilité de synchroniser les données M365	3	2	6	1	6	10	Supervision, plan de reprise d'activité

Légende :

	Fréquence	Nom
1	Minimale	Rare
2	Faible	Probable
3	Moyenne	Occasionnel
4	Elevée	Fréquent
5	Maximale	Inévitable

	Détectabilité
1	Détection efficace
2	Risque de non-détection
3	Détection peu fiable
4	Aucune détection

Seuil de risque
% risque > 20%

Procès-Verbal

Procès-Verbal de Recette Fonctionnelle et Technique

Projet : Mise en place d'office 365
Nom du document : PV de recette
Version : 1.0
Date : 27/06/2025
Lieu : Siège social
Rédacteur : Chef de projet

1. Objet du document

Ce procès-verbal a pour objectif de formaliser l'accord des parties prenantes sur la conformité des livrables du projet "Déploiement d'office 365". Il fait suite aux tests techniques, fonctionnels et utilisateurs réalisés dans l'environnement de recette.

2. Contexte

Le projet a suivi une méthode en cascade. Ce PV clôt la phase de validation avant mise en production. Il synthétise les éléments testés, les écarts éventuels, et confirme ou non l'aptitude au déploiement général.

3. Participants

Fonction	Rôle
Chef de projet	Coordination et pilotage
Administrateur IT	Tests techniques
Référent métier (Service X)	Tests fonctionnels

4. Éléments testés

Type de test	Description	Statut	Observations
Tests techniques	Création compte, accès Outlook, OneDrive, Teams	A définir	A définir
Tests fonctionnels	Réunions Teams, partages OneDrive, navigation	A définir	A définir
Tests de performance	Téléversement simultané, sessions multiples	A définir	A définir
Tests de sécurité	Authentification, accès restreint	A définir	A définir
Tests d'ergonomie	Navigation, lisibilité, accessibilité	A définir	A définir
Documentation	Guides et supports utilisateurs	A définir	A définir

5. Critères de validation

- Toutes les fonctionnalités ont été testées sans blocage majeur
- Aucun incident critique en cours
- Documentation livrée aux utilisateurs référents
- Avis favorable de la DSI et des représentants métiers

6. Décision

A définir une fois le document « PV de recette » validé.

7. Signatures

Formulaire de satisfaction

Votre avis sur le nouvel environnement Microsoft 365

Dans le cadre du déploiement de Microsoft 365 dans notre organisation, nous souhaitons recueillir votre retour. Ce questionnaire rapide nous permettra d'améliorer nos accompagnements futurs.
Réponses anonymes – Temps estimé : **3 minutes**

Bonjour, Info. Lorsque vous soumettez ce formulaire, le propriétaire verra votre nom et votre adresse e-mail.

* Obligatoire

1. Votre service ? *

Entrez votre réponse

2. Avez-vous bien été informé(e) du déploiement de Microsoft 365 ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Partiellement

3. Avez-vous participé à une session de formation ou de sensibilisation ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◯ Je sais pas

4. Avez-vous trouvé les outils faciles à prendre en main ? *

Type : Échelle d'évaluation (1 à 5)1 = Très difficile5 = Très facile

- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3
- ◯ 4
- ◯ 5

5. Quel outil utilisez vous le plus ? (choix multiple) *

- [ ] Outlook
- [ ] OneDrive
- [ ] Teams
- [ ] Word/Excel/PowerPoint
- [ ] Je n'utilise pas encore ces outils

6. Avez-vous rencontré des difficultés techniques ? *

- ○ Non
- ○ Oui

7. Comment évaluez vous votre niveau global de satisfaction ? *

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

8. Avez-vous des suggestions ou remarques ? *

Entrez votre réponse

Envoyer
